

Committente

PROVINCIA DI TERNI

Viale della Stazione, 1 - 05100 Terni (TR)
Area Tecnica



D						
C						
B						
A	Novembre 2020	Aggiornamento	Revisione	Palazzini	Bazzurri	Lucarelli
0	Marzo 2020	Emissione	Prima emissione	Palazzini	Bazzurri	Lucarelli
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Progetto

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SEDE DELL'I.T.T. "ALLIEVI-SANGALLO

Via C. Battisti, 131 - 05100 Terni (TR)
CUP: F41I18000190001 - 7642094777

Livello di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P. AGGIUDICATARIO

Capogruppo mandataria

EXUP

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Socio N.887

Mandanti



Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77



Str. Calvese, 30 - 05035 Narni (TR)

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo Lucarelli

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Andrea Maggini
Ing. Diego Calderini

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. David Cocca
Arch. Diego Giubilei
Arch. Eugenia Cecchetti

PROGETTO ANTINCENDIO E IMPIANTI
Ing. Francesco Vita

PROGETTO ACUSTICO
Ing. Jr. Michele Magrini Alunno

COMPUTISTICA
Ing. Alessandro Capacci

COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Giacomo Bazzurri

GEOLOGIA
Geol. Giorgio Piagnani

INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
Ge.Ar. sas di Arcangelo Giorgio

PROVINCIA DI TERNI

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Donatella Vinti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sabrina Borghi

Nome file

d-ES-01_piano di sicurezza e coordinamento

Commessa

19026

Scala

Elab

e-ES

Oggetto

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

Tav

02

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto

30-giu-2021 - 16-lug-2022

Completamento
Attività
Risorse

0%
103
3

Attività

Nome	Data d'inizio	Durata	Data di fine
NUOVI ELEMENTI IN C.A.	30/06/21	127	27/12/21
ZONA 01 - S1	30/06/21	38	20/08/21
ZONA 01 - S2	30/06/21	38	20/08/21
ZONA 02 - S1	03/11/21	38	27/12/21
ZONA 02 - S2	03/11/21	38	27/12/21
ADEGUAMENTO INFISSI	21/07/21	114	29/12/21
ZONE 1, 02a e 02b	21/07/21	114	29/12/21
INTONACO ARMATO	23/08/21	200	06/06/22
ZONA 01 - S1	23/08/21	20	17/09/21
ZONA 01 - S2	23/08/21	20	17/09/21
ZONA 02a - S1	10/01/22	10	21/01/22
ZONA 02b - S1	10/02/22	10	23/02/22
ZONA 04a - S1	10/03/22	6	17/03/22
ZONA 04b - S2	25/02/22	6	04/03/22
ZONA 04c - S1	19/04/22	6	27/04/22
ZONA 04d - S2	05/04/22	6	12/04/22
ZONA 04e - S1	27/05/22	6	06/06/22
ZONA 04f - S2	05/04/22	6	12/04/22
CHIUSURA NICCHIE TUTTO SPESSORE	20/09/21	183	09/06/22
ZONA 01 - S1	20/09/21	9	30/09/21
ZONA 01 - S2	20/09/21	9	30/09/21
ZONA 02a - S2	28/12/21	5	03/01/22
ZONA 02b - S2	10/01/22	5	14/01/22
ZONA 04a - S1	18/03/22	3	22/03/22
ZONA 04b - S2	07/03/22	3	09/03/22
ZONA 04c - S1	28/04/22	3	02/05/22
ZONA 04d - S2	07/03/22	3	09/03/22
ZONA 04e - S1	07/06/22	3	09/06/22
ZONA 04f - S2	13/04/22	3	15/04/22
IRRIGIDIMENTI DI PIANO	01/10/21	10	14/10/21
ZONA 01 - S1	01/10/21	10	14/10/21
ZONA 01 - S2	01/10/21	10	14/10/21
ZONA 04f - S2	15/10/21	166	13/06/22
ZONA 01 - S1	15/10/21	4	20/10/21
ZONA 01 - S2	15/10/21	4	20/10/21
ZONA 02a - S1	24/01/22	2	25/01/22
ZONA 02b - S2	17/01/22	2	18/01/22
ZONA 03 - S1	24/02/22	3	28/02/22
ZONA 03 - S2	02/02/22	3	04/02/22
ZONA 04a - S1	23/03/22	2	24/03/22

Attività

Nome	Data d'inizio	Durata	Data di fine
ZONA 04b - S2	10/03/22	2	11/03/22
ZONA 04c - S1	03/05/22	2	04/05/22
ZONA 04d - S2	10/03/22	2	11/03/22
ZONA 04e - S1	10/06/22	2	13/06/22
ZONA 04f - S2	19/04/22	2	20/04/22
TIRANTI IN ACCIAIO	21/10/21	164	15/06/22
ZONA 01 - S1	21/10/21	3	25/10/21
ZONA 01 - S2	21/10/21	3	25/10/21
ZONA 02b - S1	31/01/22	3	02/02/22
ZONA 04a - S1	25/03/22	2	28/03/22
ZONA 04b - S2	14/03/22	2	15/03/22
ZONA 04c - S1	05/05/22	2	06/05/22
ZONA 04d - S2	14/03/22	2	15/03/22
ZONA 04e - S1	14/06/22	2	15/06/22
ZONA 04f - S2	21/04/22	2	22/04/22
CONNESSIONE MARTELLI MURARI - L300	26/10/21	165	21/06/22
ZONA 01 - S1	26/10/21	5	02/11/21
ZONA 01 - S2	26/10/21	5	02/11/21
ZONA 02a - S1	26/01/22	5	01/02/22
ZONA 02b - S2	19/01/22	5	25/01/22
ZONA 03 - S1	01/03/22	7	09/03/22
ZONA 03 - S2	07/02/22	7	15/02/22
ZONA 04a - S1	25/03/22	4	30/03/22
ZONA 04b - S2	16/03/22	4	21/03/22
ZONA 04c - S1	09/05/22	4	12/05/22
ZONA 04d - S2	16/03/22	4	21/03/22
ZONA 04e - S1	16/06/22	4	21/06/22
ZONA 04f - S2	26/04/22	4	29/04/22
M05_a_b_c PRESIDIO CORRISPONDENZA ARCHITRAVI	04/01/22	122	28/06/22
ZONA 02a - S2	04/01/22	3	07/01/22
ZONA 02b - S1	02/02/22	3	04/02/22
ZONA 03 - S1	10/03/22	7	18/03/22
ZONA 03 - S2	16/02/22	7	24/02/22
ZONA 04a - S1	04/04/22	5	08/04/22
ZONA 04b- S2	22/03/22	5	28/03/22
ZONA 04c - S1	13/05/22	5	19/05/22
ZONA 04d - S2	22/03/22	5	28/03/22
ZONA 04e - S1	22/06/22	5	28/06/22
ZONA 04f - S2	02/05/22	5	06/05/22
CONSOLIDAMENTO TRAVERTINO	29/03/22	68	05/07/22
ZONA 04a - S1	11/04/22	5	15/04/22

Attività

Nome	Data d'inizio	Durata	Data di fine
ZONA 04b - S2	29/03/22	5	04/04/22
ZONA 04c - S1	20/05/22	5	26/05/22
ZONA 04d - S2	29/03/22	5	04/04/22
ZONA 04e - S1	29/06/22	5	05/07/22
ZONA 04f - S2	16/05/22	5	20/05/22
DEMOLIZIONE DI PARETE IN FALSO E RIFACIMENTO	31/03/22	2	01/04/22
ZONA 04a - S1	31/03/22	2	01/04/22
M02 CERCHIAGGI DI APERTURE CON TELAI IN ACCIAIO	31/01/22	2	01/02/22
ZONA 01 - S2	31/01/22	2	01/02/22
M08_PRESIDIO PARAPETTO	26/01/22	3	28/01/22
ZONA 02b - S1	26/01/22	3	28/01/22
SMONTAGGIO INSEGNA	09/05/22	5	13/05/22
ZONA 04f - S2	09/05/22	5	13/05/22
M07 NUOVO ARCHITRAVE ACCIAIO	31/01/22	2	01/02/22
ZONA 01 - S1	31/01/22	2	01/02/22
CONSOLIDAMENTO SCALA	26/01/22	11	09/02/22
ZONA 02a - S1	03/02/22	5	09/02/22
ZONA 02b - S2	26/01/22	5	01/02/22
RIPRISTINO IMPIANTI	30/06/21	267	15/07/22
TUTTE LE ZONE	30/06/21	267	15/07/22
SICUREZZA	30/06/21	267	15/07/22
TUTTE LE ZONE	30/06/21	267	15/07/22

Diagramma di Gantt

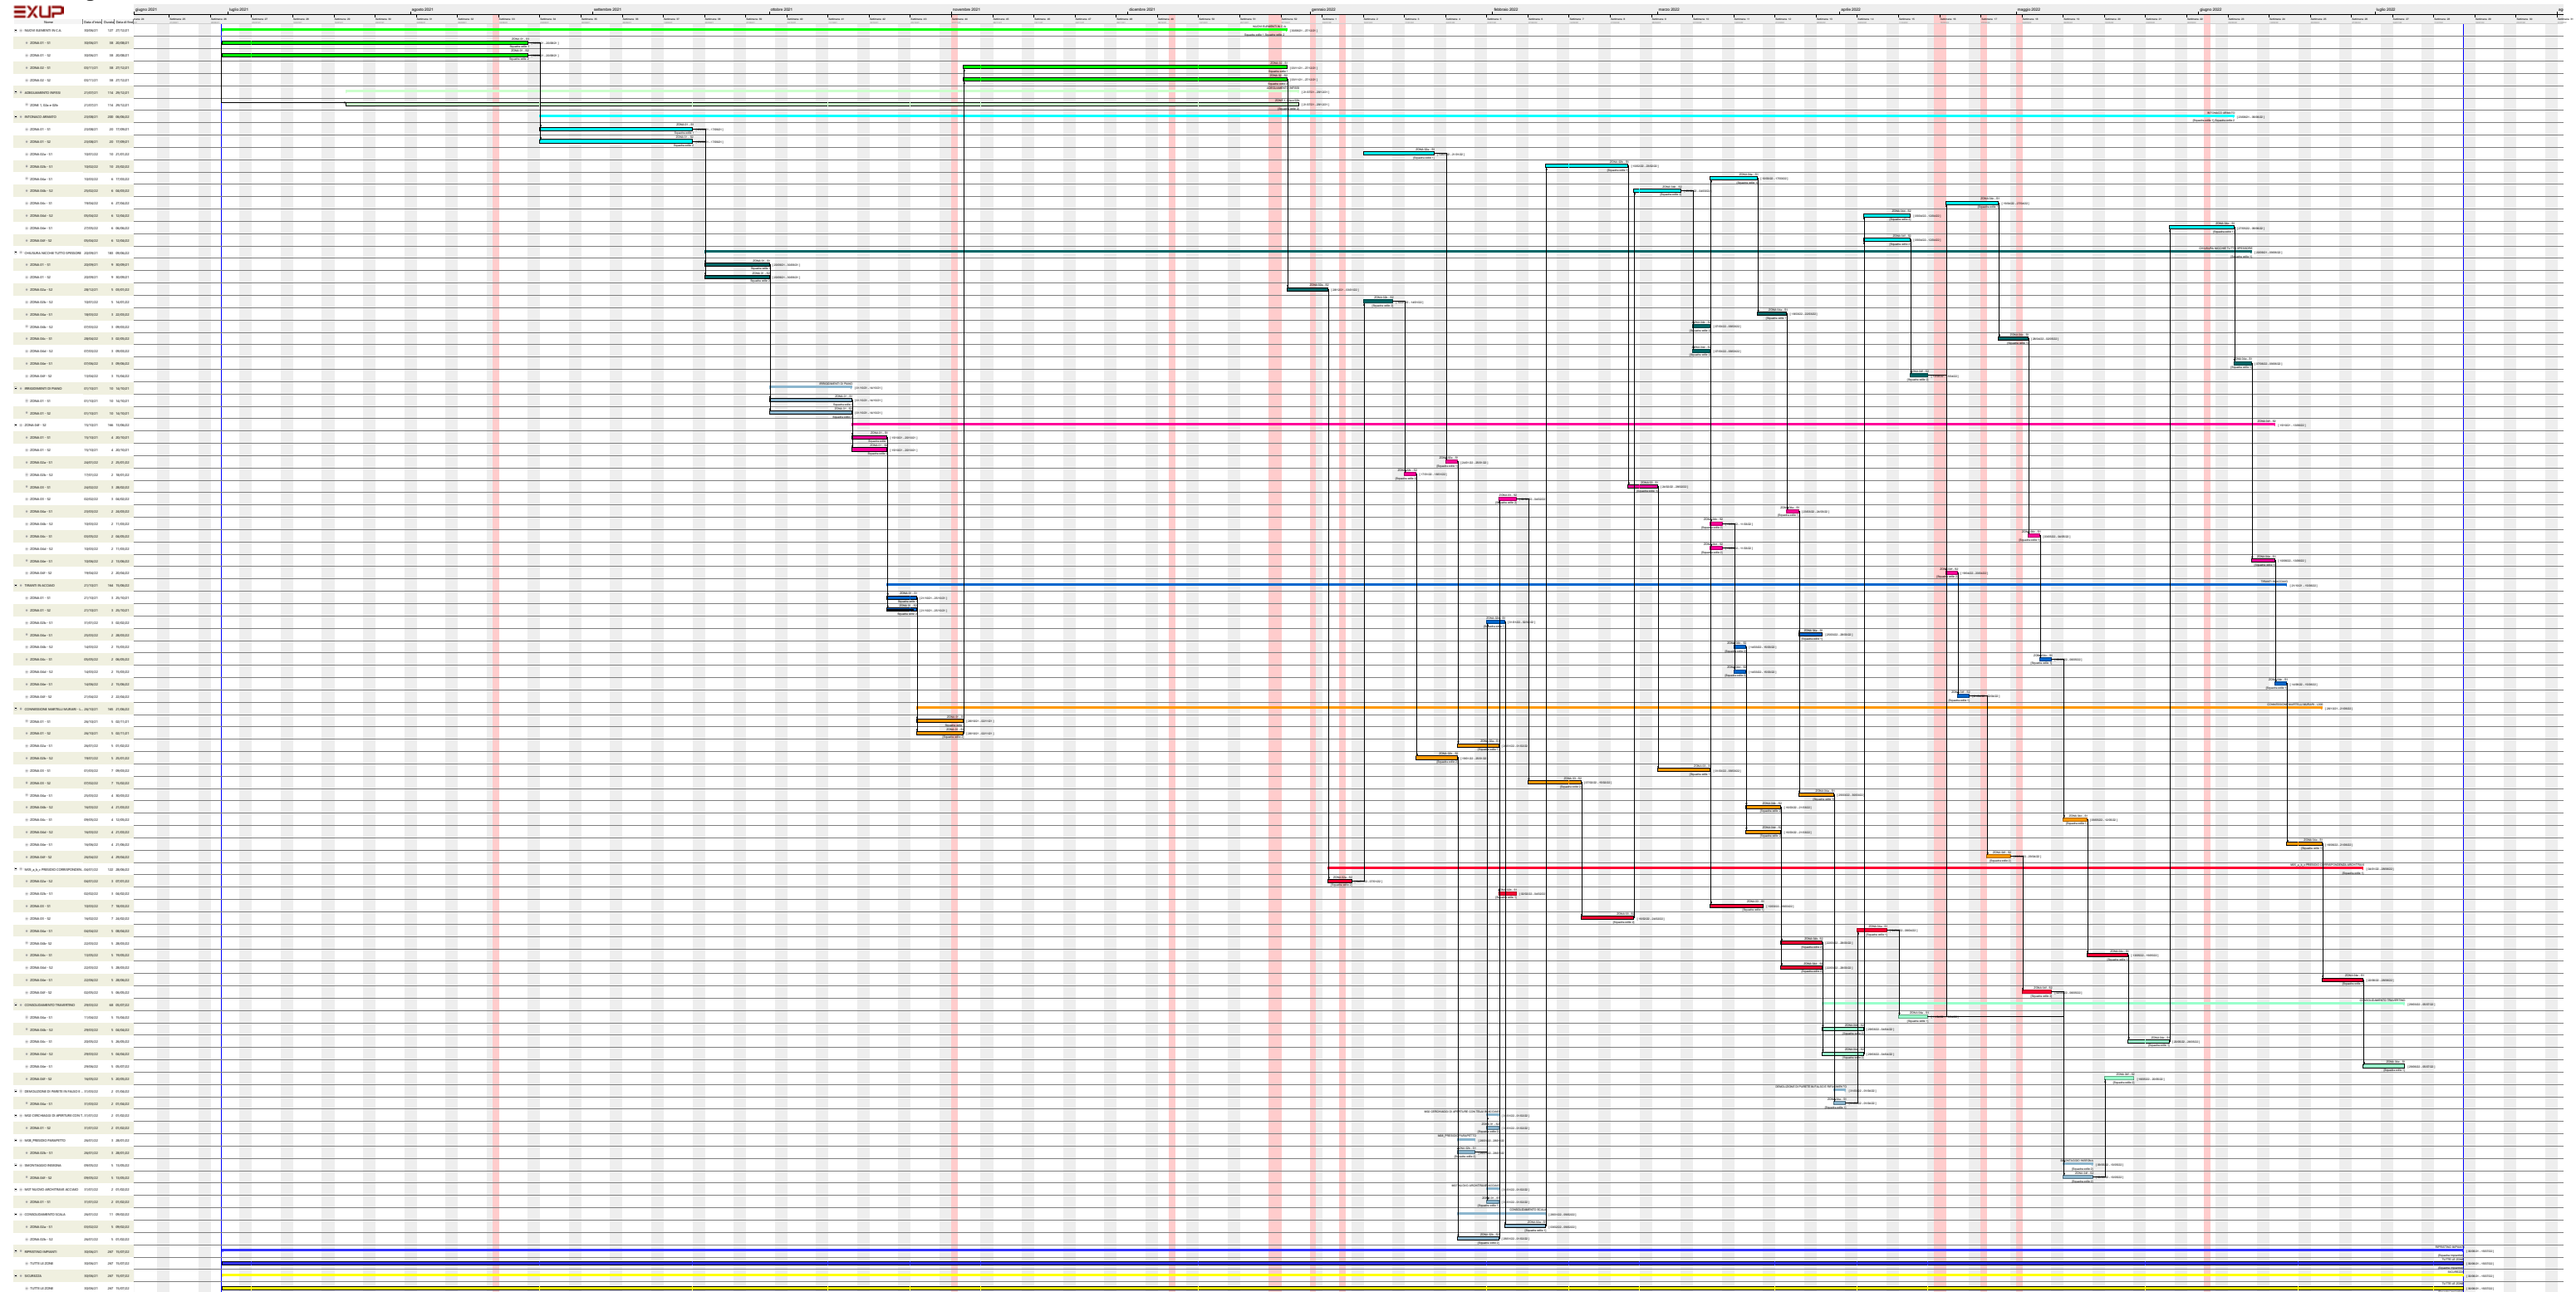


Diagramma di Gantt

